Project Xây dựng website 3Q Giải Đấu 2014

Kick-off meeting

Project Manager: VinhVT

Nội dung

- 1 Giới thiệu thông tin sản phẩm
- 2 Mục tiêu & phạm vi
- 3 Thành phần & vai trò nhân sự
- Timeline & deliverables
- 5 Quy trình & quy định

Giới thiệu thông tin sản phẩm

• Sản phẩm hỗ trợ: Mông Tam Quốc

Mức độ ưu tiên và quan trọng của sản phẩm:
 Priority 01

- Sơ lược về nội dung sản phẩm:
 - Xây dựng trang web nhận thông tin đăng ký và đưa thông tin về các giải đấu 2014
 - Domain: *giaidau.3q.com.vn*

1. Giới thiệu thông tin sản phẩm







Mục tiêu cần đạt được sau dự án

- Trang web giải đấu 3Q với tính năng Đăng ký và giải đấu series 2014
- Trang web giải đấu 3Q của năm 2013 vẫn giữ
 nguyên, và có thể sử dụng được trong năm 2014

Phạm vi thực hiện của dự án

- Ngoài các tính năng giống như giải đấu 3Q 2013, giải đấu 2014 có những thay đổi mới tóm tắt như sau:
 - Làm mới Landing page
 - Tính điểm cho Đội đấu khi kết thúc giải đấu: hạng 1
 =3 điểm, hạng 2=2 điểm, hạng 3=1 điểm
 - Sơ đồ kết quả thi đấu trình bày lại
 - Đội đấu từ hạng 1 -> 4 thì không được đăng ký giải tiếp theo
 - Thêm lựa chọn trong khoảng thời gian nào đó mà Admin cho phép thì đội đấu có thể thay đổi N thành viên.
 - Thêm địa điểm thi đấu khi đăng ký giải đấu

Phạm vi thực hiện của dự án

- Tính năng website:
 - Landing page
 - Main series 2014 (giới thiệu)
 - Tin tức + chi tiết tin tức
 - Danh sách Đội đấu
 - Thông tin đội đấu
 - Kết quả cá nhân
 - Lịch thi đấu
 - Kết quả thi đấu
 - Đăng ký

Quality Control:

- Chất lượng thiết kế phải được QC, PM và PG confirm
- Check usability toàn bộ thiết kế
- Đảm bảo chất lượng thành phẩm thống nhất từ design -> HTML -> Vportal
- Tool giải đấu serie 2014 được PG confirm
- Performance mainsite đạt chuẩn DnD



• Thành phần tham gia dự án



Vai trò

– Prj manager:

- Có quyền quyết định cao nhất trong Prj
- Phân chia task cho thành viên trong Prj
- Tracking, report tổng quan về Prj.
- Viết yêu cầu
- Chịu trách nhiệm toàn bộ về yêu cầu, giao diện, tính năng website, deadline, resource.

– Designer:

- Thiết kế giao diện toàn bộ website
- Report tiến độ hàng ngày cho PrjM

Vai trò

– Developer:

- Phát triển toàn bộ tính năng
- Report tiến độ hàng ngày cho PrjM

– FED Developer:


- Cắt HTML, apply template theo Plan
- Report tiến độ hàng ngày cho PrjM

– Quality Control:

- Làm test Plan, test case, thực hiện testing.
- · Report tiến độ hàng ngày cho PrjM



Master timeline

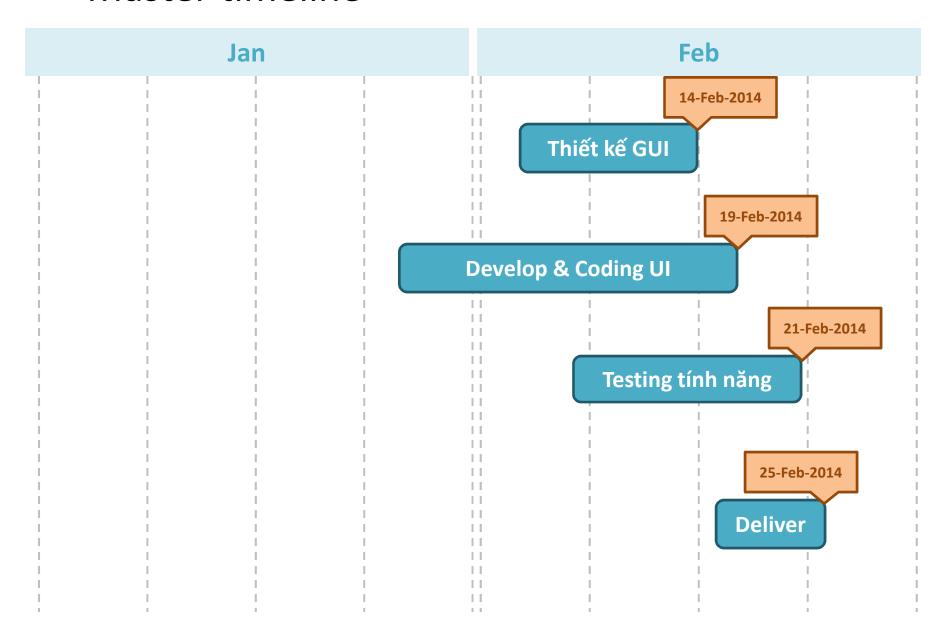

Delivery plan

No.	Deliverable	Date	Mô tả
1	Trang đăng ký	12-Feb-2014	Hoàn chỉnh test
2	Trang đội đấu	14-Feb-2014	Hoàn chỉnh test
3	Trang sơ đồ kết quả thi đấu	19-Feb-2014	Hoàn chỉnh test
4	Landing page	21-Feb-2014	
5	Real environment	25-Feb-2014	Sẵn sàng public
6			
7			
8			



Quy trình trong dự án



Các quy định trong dự án

- Report hàng ngày vào cuối ngày
- Phản hồi ngay những thông tin thấy chưa rõ ràng(trực tiếp, email, phone, ...)
- Commit deadline
- Meeting on-time
- Phản ứng nhanh với việc chỉnh sửa/thay đổi so với yêu cầu ban đầu(có sự đồng ý của PM)

Q&A

THANKS YOU!
